



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI





Plangenehmigungsverfahren



**Stimmt diese
Aussage für alle
Projekte?**



Traktanden

- Allgemein Planvorlagen
- Genehmigungsablauf Projekte Übertragungsnetz
- Strategisches Netz
- Ausbau / Ertüchtigung bestehender Netze



Allgemein Planvorlagen

- Gesuche für Plangenehmigungen pro Jahr

Anzahl: ca. 7300

davon

ordentliches Verfahren ca. 20 %

vereinfachtes Verfahren ca. 80 %



Allgemein Planvorlagen

- Projekte mit Einsprachen pro Jahr ca. 75
- Weiterleitung an das BFE ca. 15
- Fristgerechte Erledigung ca. 96 %
(vereinfachte Verfahren: 20 Arbeitstage)
(ordentliche Verfahren: Normalfall 3 Monate)



Genehmigungsablauf Projekte Übertragungsnetz

- Projektidee definieren
- Durchführung Sachplanverfahren (SÜL)
dreistufiges Verfahren
- Erstellen Projektdossier mit Umweltverträglichkeitsbericht
- Plangenehmigungsverfahren
- Projektrealisierung (Bau)
- Projektabnahme



Sachplanverfahren

- Vororientierung
Absichtserklärung
- Zwischenergebnis
Bedarfsbewertung
Korridorempfehlung
Hinweise auf Konflikte
- Festsetzung
Korridor festgelegt (Kabel/Freileitung bestimmt)
Räumliche Grobabstimmung
Konflikte bereinigt oder Interessenabwägung erfolgt
UVP, Pflichtenheft liegt vor



Plangenehmigungsverfahren

- Eingabedossier
überprüfen auf Vollständigkeit
- Start Plangenehmigungsverfahren
- Keine Einsprachen
Abwarten sämtlicher Stellungnahmen
Genehmigung innert Monatsfrist



Plangenehmigungsverfahren

- Mit einzelnen Einsprachen
Einspracheverhandlung durchführen
Bei Einigung: Genehmigen innert Monatsfrist
Ohne Einigung: Überweisung an das BFE
- Mit Einsprachen ohne Einigungschancen
Überweisung an das BFE



Verfahren BFE

- Information an alle Beteiligten, dass das Verfahren beim BFE weiter geführt wird
Durchführen Einspracheverhandlung
Entscheid BFE
- Beschwerdemöglichkeit an das Bundesverwaltungsgericht
- Weiterzug an das Bundesgericht



Verfahrensdauer

- Vororientierung SÜL 1 Monat
- Zwischenergebnis SÜL 5-6 Monate
- Festsetzung SÜL 6-9 Monate


- Projektdossier erstellen

- Dossierüberprüfung ½ Monat
- Plangenehmigungsverfahren 5 Monate
(Kanton 3 Monate, BAFU zusätzlich 2 Monate nach Erhalt
Stellungnahme Kanton)

- Weiterzug Frist unbestimmt



Strategisches Netz

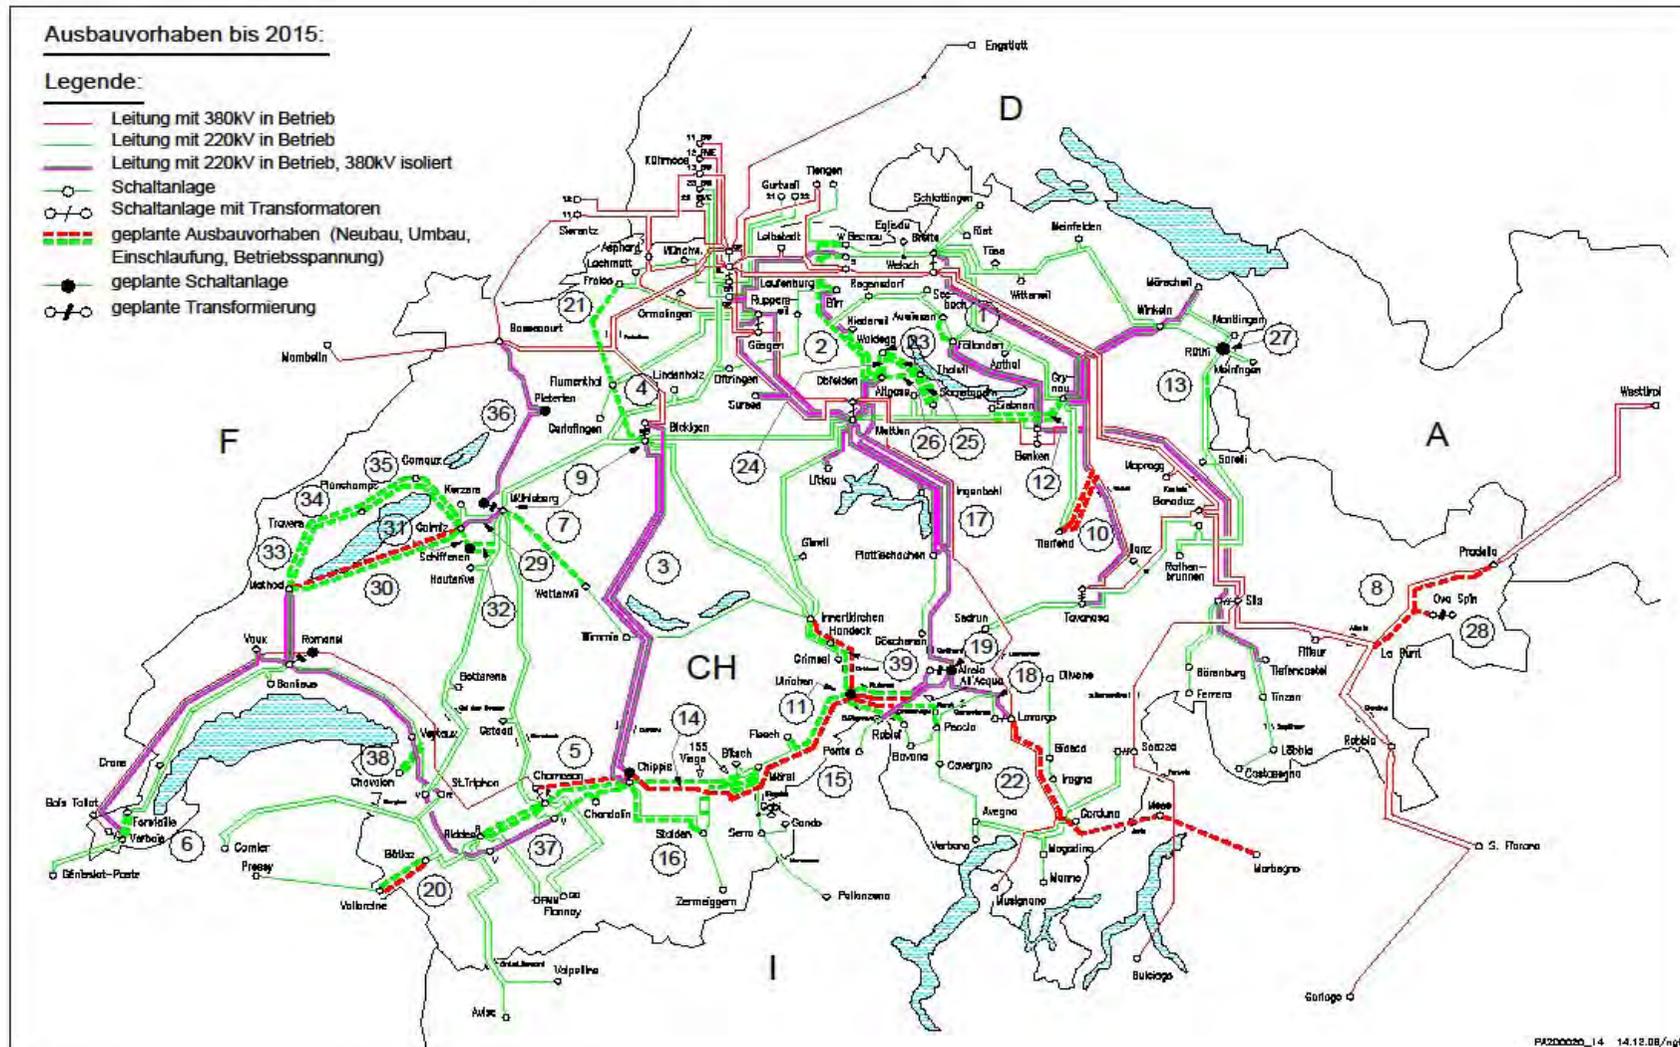



Strategisches Netz

- 52 Projekt auf der heutigen Liste
- 39 Projekte im strategischen Netz
- Bedarf durch Bundesrat im September 2009 festgelegt
- SÜL-Verfahren
 - Korridorfindung
 - mit Beurteilungsschema Freileitung/Kabel
 - Erfüllung Schutzkriterien
 - Leistungsart



Entwicklungsstand strategisches Netz

- 1 Projekt genehmigt
 - 8 Projekte im SÜL-Verfahren
 - 0 Projekte im Plangenehmigungsverfahren ESTI
 - 8 Projekte im Plangenehmigungsverfahren BFE
 - 2 Projekte beim Bundesverwaltungsgericht
 - 1 Projekt beim Bundesgericht
-
- Grossteil der Projekte sind bis jetzt nicht eingereicht!



Gründe für Projektverzögerungen

- Kantonale Stellungnahmen verzögert
- Stellungnahmen Bundesämter verzögert
- Überlastung Genehmigungsbehörde
- Projektanpassungen
(Gesuchsteller will es allen recht machen)



Gründe für Projektverzögerungen

- Nichtionisierende Strahlung (NIS)
- Lärmschutz
- Landschaftsschutz
- Persönliche Betroffenheit



Massnahmen zur Verfahrensbeschleunigung

- Koordinationsgesetz
- Arbeitsgruppe LVS
 - Projektkoordinator beim BFE
 - Teilweise Verzicht auf Einspracheverhandlungen durch das ESTI
- Keine Projektanpassung während Verfahren



Ausbau / Ertüchtigung bestehender Leitungen

- Plangenehmigung am Anfang nicht ausgenützt
Grundlagen nicht mehr die gleichen!
Lärmschutz
NIS
Heute grössere Abstände verlangt
- Leitungsumbau
Spannungserhöhung
AC zu DC



Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit



www.esti.admin.ch
